


中糖世纪股份有限公司湖北分公司维修改造项目-库房内墙粉刷

——总平面布置图

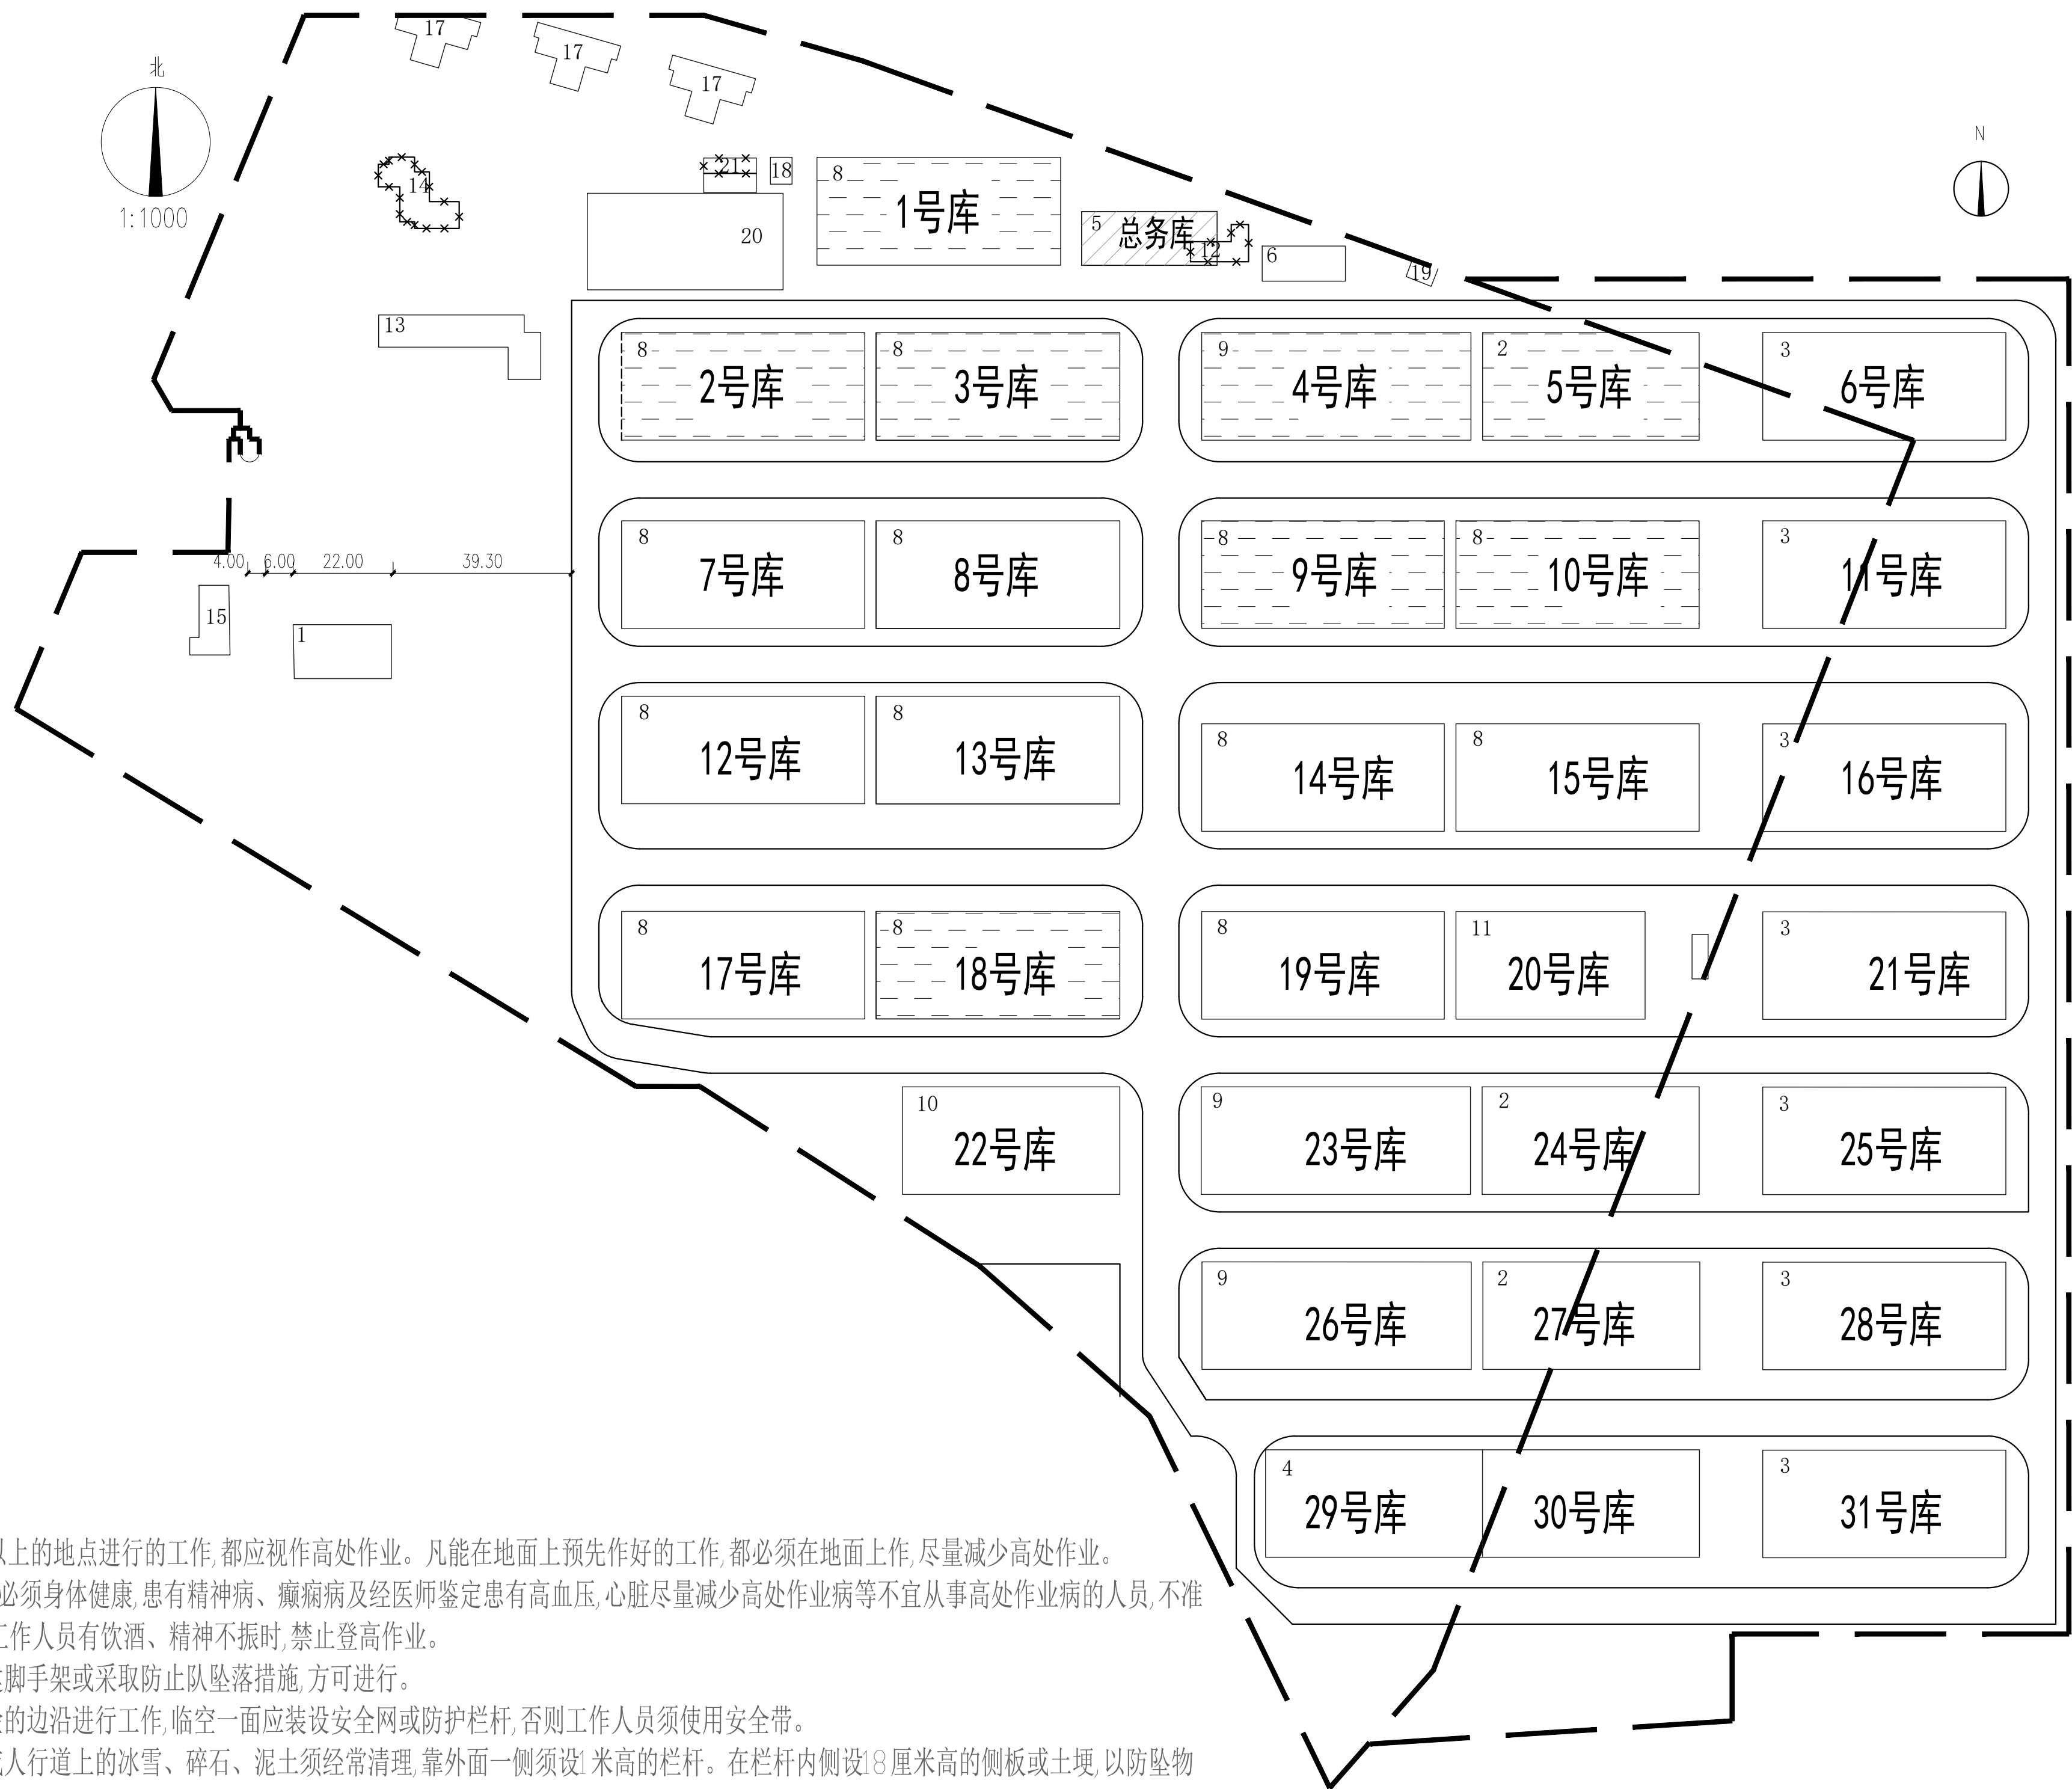

高空作业防护说明

- 1 、凡在地面2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,都必须在地面上作,尽量减少高处作业。
- 2 、担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压,心脏尽量减少高处作业病等不宜从事高处作业病的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。
- 3、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施,方可进行。
- 4、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则工作人员须使用安全带。
- 5、峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理,靠外面一侧须设1 米高的栏杆。在栏杆内侧设18 厘米高的侧板或土埂,以防坠物伤人。
- 6、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5 米,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。
- 7、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔6 个月)进行静荷重试验,试验荷重为225 公斤,试验时间为5 分钟,试验后检查是否有变形、破裂等,并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。
- 8、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
- 9、高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
- 10、在进行高处工作时,除有关人员处,不准他人在工作地点的下面行或逗留,工作地点下面应围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。
- 11、不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
- 12、上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板,罩棚或其他隔离设施,工作人员必须戴安全帽。
- 13、冬季在低于零下十度进行露天高处工作,必要时应该在施工地区附近设有取暖的休息所,取暖设备应有专人管理,注意防火
- 14、在6 级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
- 15、禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶进行工作。为了防止误登,应在这种结构的必要地点挂上警告牌。

图例:

库房内墙粉刷项目

改造项目一览表

序号	项目类型	改造名称	建设内容
1	储备物资保管安全投入	1号、2号、3号、4号、5号、9号、10号、18号一共8栋库内墙粉刷项目;	一、库房内墙粉刷项目 1. 内墙涂料层铲除; 2. 局部抹灰层裂缝修复:14mm*6mm分层抹灰, 面层压光; 3. 满刮腻子三遍、刷防霉涂料二遍;

1. 设计依据

- 1.1 甲方提供的改造工程项目设计任务委托书;
- 1.2 甲方提供的改造工程项目原始资料;
- 1.3 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。

2. 项目概况

- 2.1、本工程为中糖世纪股份有限公司湖北分公司维修改造项目-库房内墙粉刷。
- 2.2、本项目是对已有仓库设施的升级改造项目,不改变原有土地规划,不涉及规划变更及审批。

3. 设计范围

- 3.1 1号、2号、3号、4号、5号、9号、10号、18号一共8栋库内墙粉刷项目,总面积12750m²。

4. 施工要求和安全

- 4.1 施工所用的脚手架必须符合规范要求,根据本项目的特点采用双排脚手架;搭设脚手架时,必须要搭设平稳,安全,拉接到位,验收合格后方可使用;拆除时,必须封锁拆除区域,且有专人看管,不得非拆除人员进出,同时要注意成品保护和设施的保护工作
- 4.2 在施工中,施工区域内应采用警戒线封闭,非施工人员不得入内,车辆绕行;
- 4.3 在施工中,高危地区基求佩戴安全带等安全措施;
- 4.4 施工人员必须遵守安全生产手册,正确佩戴安全用品,施工现场不得抽烟,酒后不得上岗等;
- 4.5 在施工期间不得扰民;
- 4.6 施工所需的水电应在施工区域50m内。

郑州中粮科研设计院有限公司

COFCO Engineering&Technology (Zhengzhou) Co.,Ltd.
商物粮行业甲级 建筑工程甲级
编号:A141029852
地址：河南省郑州市高新区莲花街52号
电话：（0371）56826919
邮编：450001
传真：（0371）63721015
网址：http://www.grainztdi.com



会 签 栏 COUNTERSIGNATURE COLUM		
专 业 DISCIPLINE	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE
建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE		
给 排 水 PLUMBING		
暖 通 HVAC		
电 气 ELECTRICITY		
工 艺 PROCESS		

执业签章

REGISTRATION STAMP

出图签章

RELEASE STAMP

03		
02		
01	首次发行 FIRST ISSUE	
版 次 REV	摘 要 SUBJECT	发行日期 ISSUED DATE

建设单位 CLIENT	中糖世纪股份有限公司湖北分公司
----------------	-----------------

工程名称 PROJECT NAME	中糖世纪股份有限公司湖北分公司维修改造项目
----------------------	-----------------------

工程编号 PROJECT NO.	
---------------------	--

职 责 FUNCTION	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE
审 定 APPROVED	刘 霞	刘霞
项目负责人 PRO. MANAGER	岳佳超	岳佳超
专业负责人 DIS. MANAGER	岳佳超	岳佳超
审 核 AUDITED	张 扬	张 扬
校 对 CHECKED	田保华	田保华
设 计 DESIGNED	孟丽君	孟丽君

图 名: DRAWING NAME	??????
----------------------	--------

子项名称 SUB-ITEM NAME	总图
设计阶段 DESIGN PHASE	初步设计
专 业 DISCIPLINE	建筑
图 号 DRAWING NO.	
